




RESUMO GERAL - SESC VENDA NOVA - REFORMA DO PARQUE AQUATICO - DEMOLIÇÕES COMPLEXAS DA ÁREA EXTERNA/DECK E FACHADA E SEUS REVESTIMENTOS

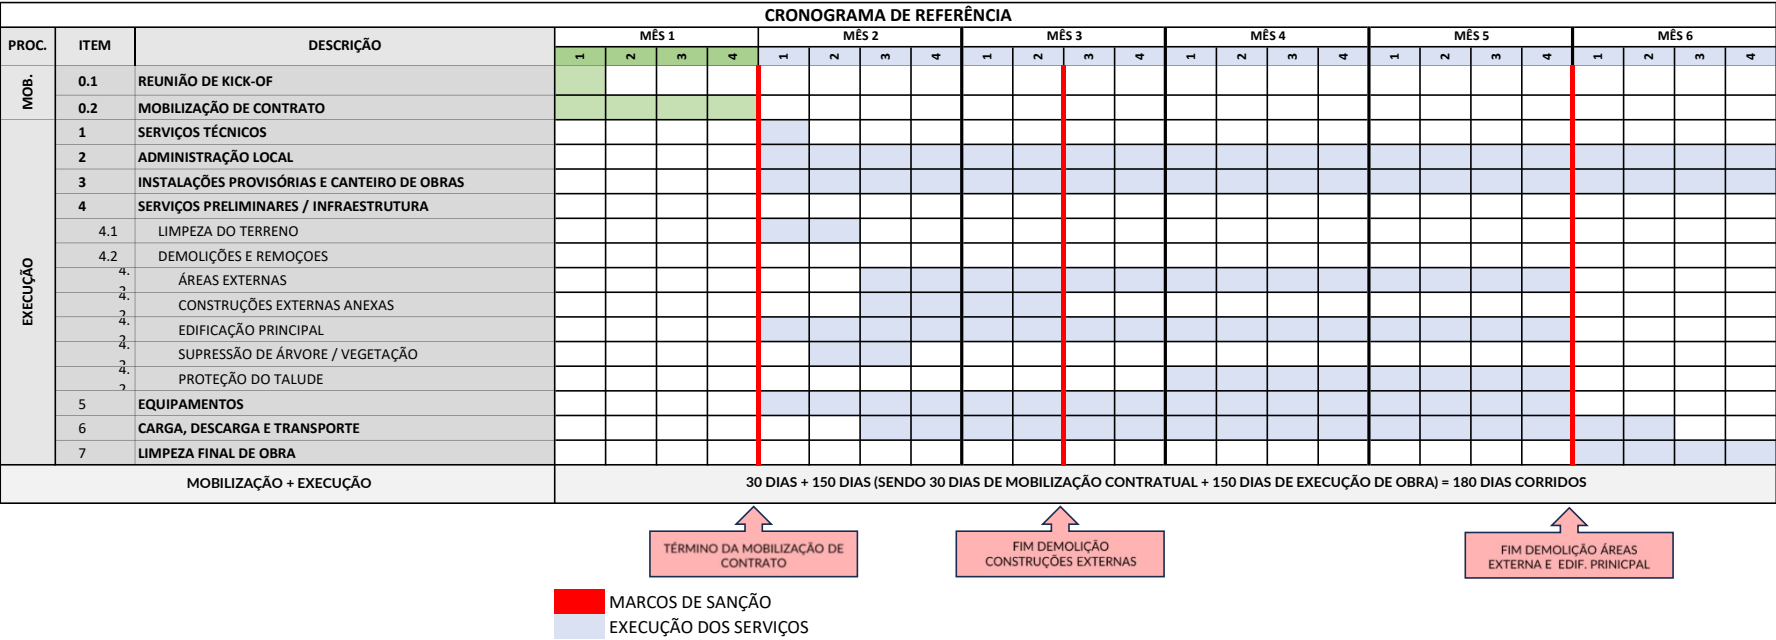

RAONI  
FERREIRA  
NAKAMURA:2  
1984829831

Assinado de forma digital  
por RAONI FERREIRA  
NAKAMURA:2198482983


1  
Dados: 2025.01.29  
12:04:23 -03'00'

MARCO 01.: FIM DEMOLIÇÃO  
CONSTRUÇÕES EXTERNAS

Assinado de forma digital  
por RAONI FERREIRA  
NAKAMURA:2198482983  
1  
Dados: 2025.01.29  
12:04:59 -03'00'

MARCO 02: FIM DEMOLIÇÃO ÁREAS  
EXTERNA E EDIF. PRINCIPAL

<div>Sesc</div> <div>SESC VENDA NOVA - REFORMA DO PARQUE AQUATICO - DEMOLIÇÕES COMPLEXAS DA ÁREA EXTERNA/DECK E FACHADA E SEUS REVESTIMENTOS</div>					Meses		Mês 5																																
					Semanas		SEMANA 22							SEMANA 23							SEMANA 24						SEMANA 25						SEMANA 26						
					Dias corridos		148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
ITEM	DESCRIÇÃO DA TAREFA	DURAÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO																																			
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS	150 dia	31	180																																			
3.1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	2 dias	32	33																																			
3.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	30 dias	31	60																																			
3.3	TAPUMES / CERCAS / FECHAMENTOS	15 dias	31	45																																			
3.4	CANTEIRO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DOS CHALES 91, 92 E 93 PARA UTILIZAÇAO COMO CANTEIRO DE OBRAS	15 dias	31	45																																			
3.5	MOBILIÁRIOS PARA CANTEIRO DE OBRAS	5 dias	45	49																																			
3.6	CAMINHÃO PIPA	143 dias	38	180																																			
3.7	LAVA RODAS	143 dias	38	180																																			
3.8	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	136 dias	38	173																																			
4	SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA	130 dias	36	165																																			
4.1	LIMPEZA DO TERRENO	16 dias	37	52																																			
4.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	130 dias	36	165																																			
4.2.1	ÁREAS EXTERNAS	120 dias	46	165																																			
4.2.2	CONSTRUÇÕES EXTERNAS ANEXAS	64 dias	42	105																																			
4.2.3	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	130 dias	36	165																																			
4.2.4	SUPRESSÃO DE ÁRVORE / VEGETAÇÃO	7 dias	46	52																																			
4.2.5	PROTEÇÃO DO TALUDE	60 dias	106	165																																			
5	EQUIPAMENTOS	130 dias	36	165																																			
5.1	ANDAIME	130 dias	36	165																																			
5.2	PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA COM CESTO	90 dias	76	165																																			
6	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	130 dias	36	165																																			
6.1	CARGA E DESCARGA	130 dias	36	165																																			
6.2	TRANSPORTE	130 dias	36	165																																			
7	LIMPEZA FINAL DE OBRA	5 dias	176	180																																			

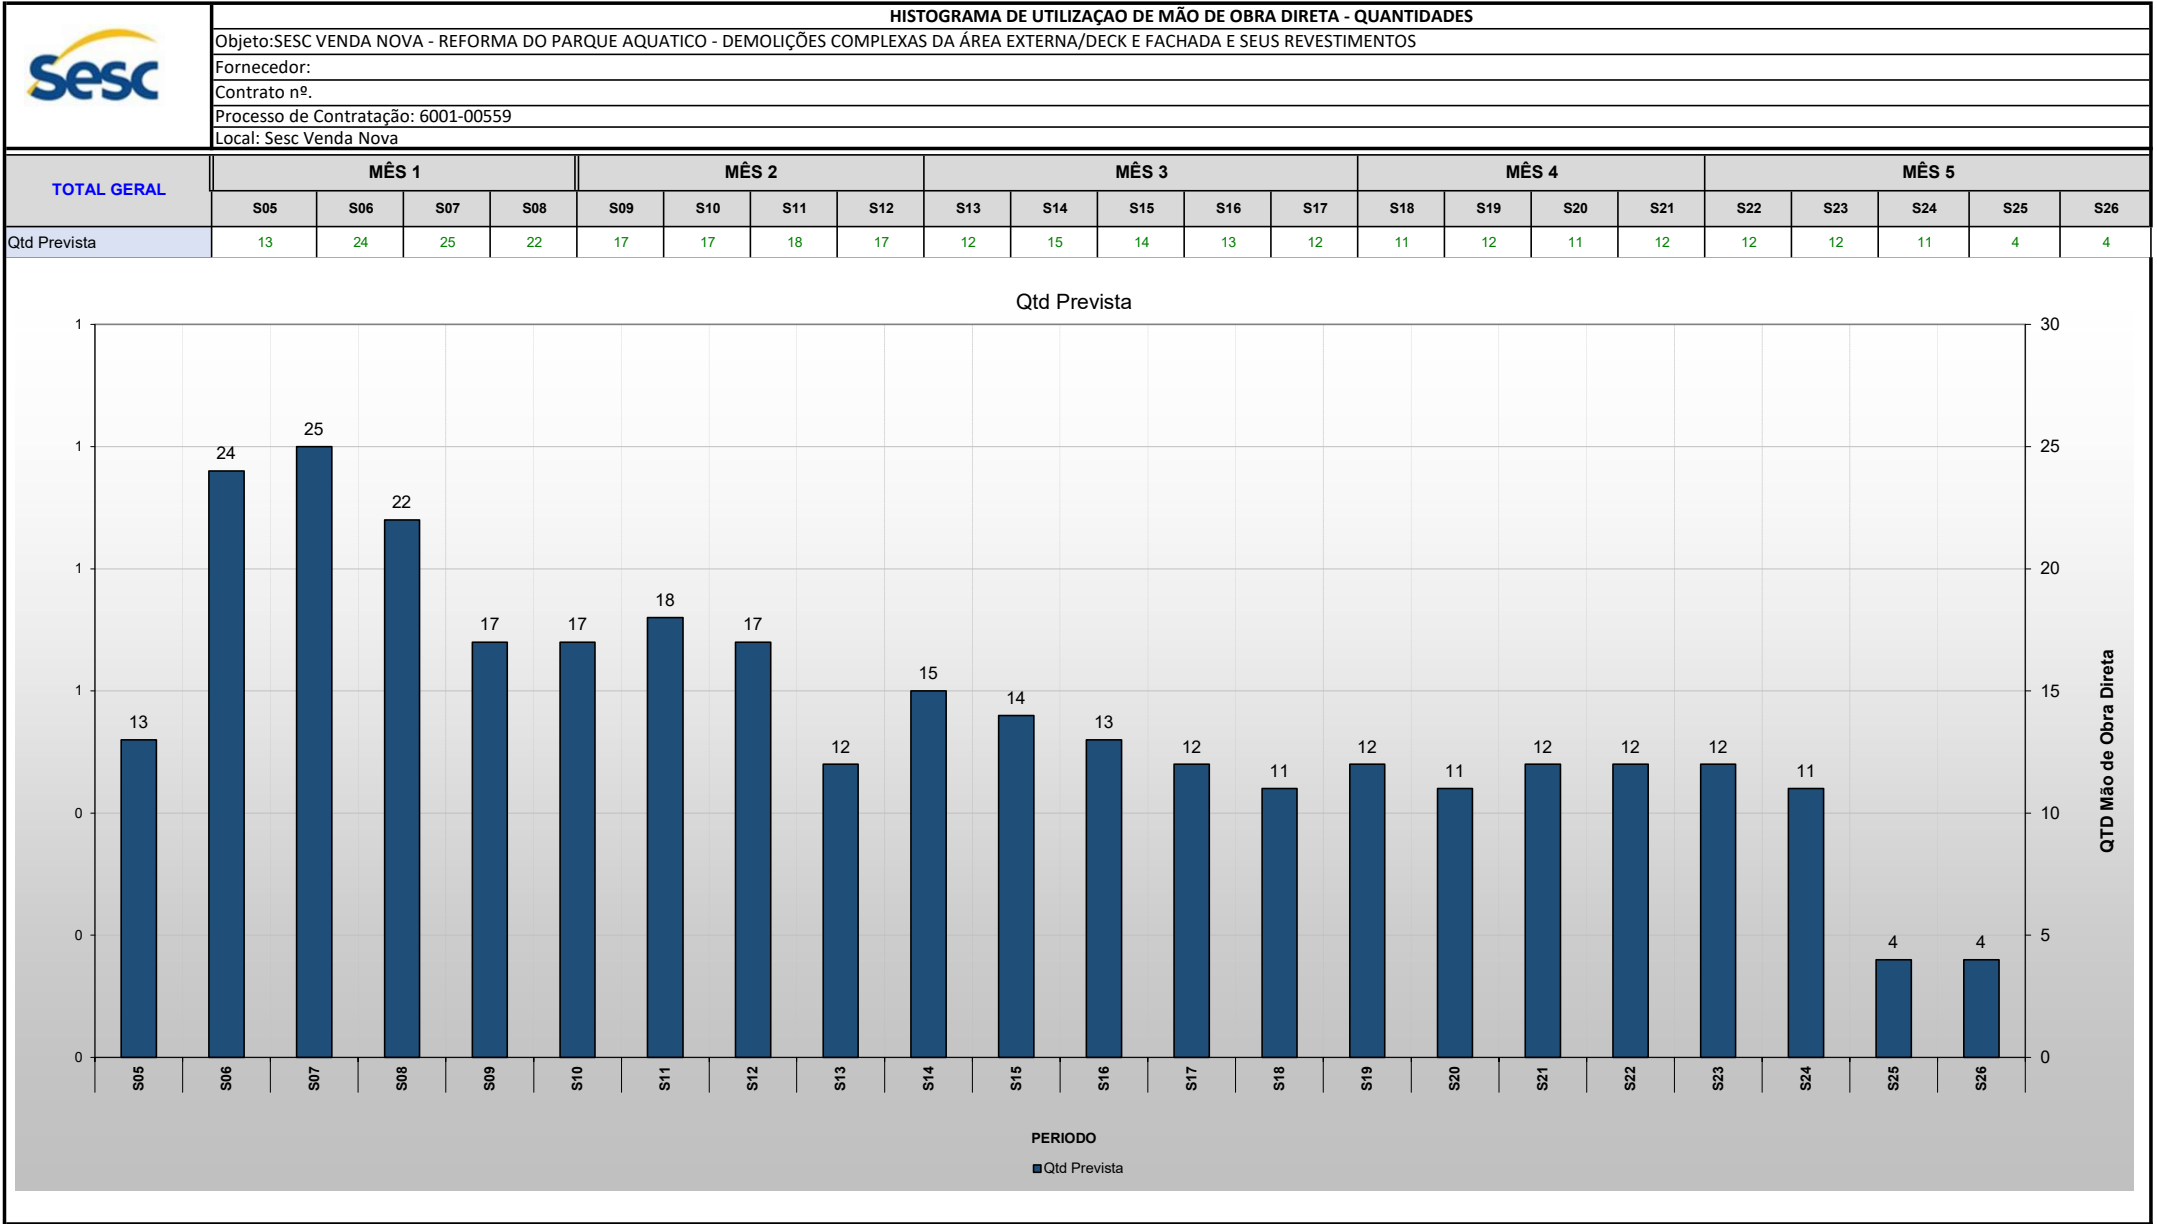

Código	Banco	Grupo	Descrição		Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
									Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral	
			ADM LOCAL												
00040813	SINAPI		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)		Mão de Obra	MES	5,14		25.560,94		131.276,08		131.276,08	6,94%	434.347,71
00040818	SINAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)		Mão de Obra	MES	5,09		11.097,74		56.501,92		56.501,92	2,99%	800.117,63
00040944	SINAPI		TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)		Mão de Obra	MES	5,08		7.673,53		38.961,96		38.961,96	2,06%	982.666,02
00040812	SINAPI		AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)		Mão de Obra	MES	5,02		3.864,50		19.407,13		19.407,13	1,03%	1.365.010,98
00040945	SINAPI		TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)		Mão de Obra	H	211,18		40,16		8.481,10		8.481,10	0,45%	1.656.215,17
			MDO SERVIÇOS TÉCNICOS												
00007592	SINAPI		TOPOGRAFO (HORISTA)		Mão de Obra	H	100,96		50,85		5.133,66		5.133,66	0,27%	1.724.005,68
00000244	SINAPI		AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)		Mão de Obra	H	100,96		22,86		2.307,88		2.307,88	0,12%	1.802.826,53
56.11.04	SUDECAP		ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO		Mão de Obra	H	7,50		172,17		1.291,28		1.291,28	0,07%	1.834.235,05
MOCO-33043	SETOP		ENGENHEIRO/ARQUITETO (NÍVEL: SÊNIOR)		Mão de Obra	H	7,00		180,07		1.260,50		1.260,50	0,07%	1.836.780,70
56.13.04	SUDECAP		PROJETISTA CADISTA - PROJETO		Mão de Obra	H	3,12		45,61		142,51		142,51	0,01%	1.887.667,58
MOCO-33046	SETOP		PROJETISTA TÉCNICO/CADISTA		Mão de Obra	H	4,00		74,47		297,89		297,89	0,02%	1.879.588,57
			OPERADORES DE MAQUINAS/MOTORISTAS												
00004248	SINAPI		OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)		Mão de Obra	H	981,15		30,62		30.042,90		30.042,90	1,59%	1.116.969,73
00020020	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)		Mão de Obra	H	724,87		31,88		23.108,72		23.108,72	1,22%	1.301.672,99
00004254	SINAPI		OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)		Mão de Obra	H	565,46		37,05		20.950,36		20.950,36	1,11%	1.345.603,85
00004234	SINAPI		OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)		Mão de Obra	H	473,47		38,72		18.332,70		18.332,70	0,97%	1.383.343,67
00004093	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)		Mão de Obra	H	412,27		30,70		12.656,74		12.656,74	0,67%	1.516.746,68
00004230	SINAPI		OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)		Mão de Obra	H	59,22		35,47		2.100,46		2.100,46	0,11%	1.807.216,22
			MDO CIVIL	CL	TIPO	H	QTD								
00006114	SINAPI		AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	AJUDANTE GERAL	Mão de Obra	H	493,72		20,03		9.889,12		9.889,12	0,52%	1.584.828,89
MOED-20039	SETOP		AJUDANTE DE ARMADOR (MODALIDADE: HORISTA ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	AJUDANTE GERAL	Mão de Obra	H	0,03		20,04		0,55		0,55	0,00%	1.892.498,45
099034	SBC		AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	AJUDANTE GERAL	Mão de Obra	H	29,37		21,05		618,06		618,06	0,03%	1.861.660,45
099806	SBC		AJUDANTE DE ELETRICISTA	AJUDANTE GERAL	Mão de Obra	H	25,04		21,05		527,02		527,02	0,03%	1.866.262,07
00000247	SINAPI		AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	AJUDANTE GERAL	Mão de Obra	H	15,88		20,03		317,99		317,99	0,02%	1.878.043,81
00034466	SINAPI		AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	AJUDANTE GERAL	Mão de Obra	H	8,10		20,03		162,23		162,23	0,01%	1.885.997,28
00000242	SINAPI		AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	AJUDANTE GERAL	Mão de Obra	H	213,86		21,70		4.640,67		4.640,67	0,25%	1.743.302,10
00000378	SINAPI		ARMADOR (HORISTA)												

099250	SBC	ELETRICISTA	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	27,60	22,17	611,70	611,70	0,03%	1.862.887,92	98,50%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	225,82	26,52	5.988,62	5.988,62	0,32%	1.702.594,51	90,02%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	ENCANADOR	Mão de Obra	H	54,53	26,52	1.446,08	1.446,08	0,08%	1.827.374,17	96,62%
00002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	MONTADOR	Mão de Obra	H	101,43	22,57	2.289,23	2.289,23	0,12%	1.805.115,76	95,44%
00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	PEDREIRO	Mão de Obra	H	2,49	28,08	69,94	69,94	0,00%	1.890.272,69	99,95%
00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	MONTADOR	Mão de Obra	H	1.140,79	23,78	27.127,97	27.127,97	1,43%	1.200.939,50	63,50%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	PEDREIRO	Mão de Obra	H	11,12	24,95	277,55	277,55	0,01%	1.880.437,08	99,43%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,59	24,95	14,83	14,83	0,00%	1.892.160,21	100,05%
00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	PEDREIRO	Mão de Obra	H	225,00	24,50	5.512,49	5.512,49	0,29%	1.713.721,92	90,61%
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1.004,56	26,52	26.641,00	26.641,00	1,41%	1.227.580,50	64,91%
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	PINTOR	Mão de Obra	H	132,47	26,52	3.513,19	3.513,19	0,19%	1.763.052,01	93,22%
MOED-20151	SETOP	PINTOR (MODALIDADE: HORISTA)ENCARGOS SOCIAIS: INCLUSO)	PINTOR	Mão de Obra	H	0,27	26,53	7,06	7,06	0,00%	1.892.416,40	100,06%
00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	114,93	26,52	3.048,07	3.048,07	0,16%	1.779.223,89	94,07%
099900	SBC	SERVENTE	SERVENTE	Mão de Obra	H	7,25	17,04	123,48	123,48	0,01%	1.888.852,02	99,87%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SERVENTE	Mão de Obra	H	6.259,30	17,40	108.911,89	108.911,89	5,76%	543.259,60	28,72%
00041084	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)	SERVENTE	Mão de Obra	H	3.584,28	3.075,65	62.636,23	62.636,23	3,31%	743.615,71	39,32%
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	PEDREIRO	Mão de Obra	H	8,04	26,18	210,44	210,44	0,01%	1.883.552,20	99,59%
00010489	SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	PEDREIRO	Mão de Obra	H	167,05	20,01	3.342,70	3.342,70	0,18%	1.769.821,03	93,58%

Rótulos de Linha	Soma de QTD	UND.	DIAS	MESES	PRAZO DA OBRA (MESES)	QTD. PESSOAS
SERVENTE	9.850,83	H	1.231,35	55,97	5	12
CARPINTEIRO	1.572,82	H	196,60	8,94	5	2
PEDREIRO	1.418,86	H	177,36	8,06	5	2
MONTADOR	1.242,22	H	155,28	7,06	5	2
AJUDANTE GERAL	1.210,92	H	151,36	6,88	5	2
ELETRICISTA	253,41	H	31,68	1,44	5	1
PINTOR	132,74	H	16,59	0,75	5	1
SERRALHEIRO	114,93	H	14,37	0,65	5	1
ENCANADOR	84,51	H	10,56	0,48	5	1
ARMADOR	4,27	H	0,53	0,02	5	1
Total Geral	15.885,50					25

RAONI  
FERREIRA  
NAKAMURA:21  
984829831

Assinado de forma digital  
por RAONI FERREIRA  
NAKAMURA:2198482983

1  
Dados: 2025.01.29  
12:05:53 -03'00'
