Id	Nome da Tarefa	Duração
1	REFORMA DO MURO - LUZIA SALOMÃO - SESC VENDA NOVA	191 dias
2	MOBILIZAÇÃO DE CONTRATO	24 dias
3	FASE 01 - MOBILIZAÇÃO DE OBRA, LIMPEZA TRECHOS I A VI E DEMOLIÇÃO TRECHO I E II	8 dias
38	FASE 02 - ESTACAS TRECHOS I E II	33 dias
74	FASE 03 - PLATÔ DE TRABALHO E DEMOLIÇÃO TRECHOS III E IV	20 dias
98	FASE 04 - TALUDE PROVISÓRIO E ESTACAS TRECHOS III, IV E V	37 dias
140	1º MARCO DE SANÇÃO - FINALIZAÇÃO DE ESTAQUEAMENTO	0 dias
141	FASE 05 - PAREDES TRECHOS III, IV E V , REATERRO E TALUDE DEFINITIVO	70 dias
142	PAREDES DE CONTENÇÃO - TRECHO III, IV E V	52 dias
159	REATERRO - TRECHOS III, IV, V E VI	18 dias
163	RIP RAP - TALUDE ENTRE TRECHO V E VI	8 dias
165	2º MARCO DE SANÇÃO: FINALIZAÇÃO DO TALUDE DEFINITIVO	0 dias
166	FASE 06 - ESTACAS TRECHO VI	24 dias
167	ESTACAS - TRECHO VI	24 dias
190	FASE 07 - VEDAÇÃO, PASSEIO, PAVIMENTO E ILUMINAÇÃO	33 dias
191	ATIVIDADES EXTERNAS - RUA LUZIA SALOMÃO	33 dias
192	VEDAÇÃO E GRADIL	32 dias
193	ALVENARIA EM BLOCO APARENTE E PILARETE DE CONCRETO	25 dias
199	PEITORIL EM GRANITO	12 dias
205	VEDAÇÃO EM VIDRO	5 dias
211	CERCAMENTO - INSTALAÇÃO DA CONCERTINA	2 dias
213	PASSEIO	31 dias
214	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	4 dias
220	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, COM JUNTA DE DILATAÇÃO ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	1 dia
226	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	2 dias
232	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	2 dias
238	RECOLOCACAO DE POSTE DE SINALIZACAO COM ATÉ DUAS PLACAS	1 dia
240	PAVIMENTAÇÃO	2 dias
241	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA DA UNIDADE	2 dias
244	ATIVIDADES INTERNAS - RUA SIBIPIRUNA	22 dias
245	ESCAVAÇÃO PARA RETIRADA DE PLATÔ DE TRABALHO	6 dias
249	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO	11 dias
253	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA UNIDADE	16 dias
259	PAISAGISMO	2 dias
264	FASE 08 - DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL	4 dias
265	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA DE OBRA	4 dias

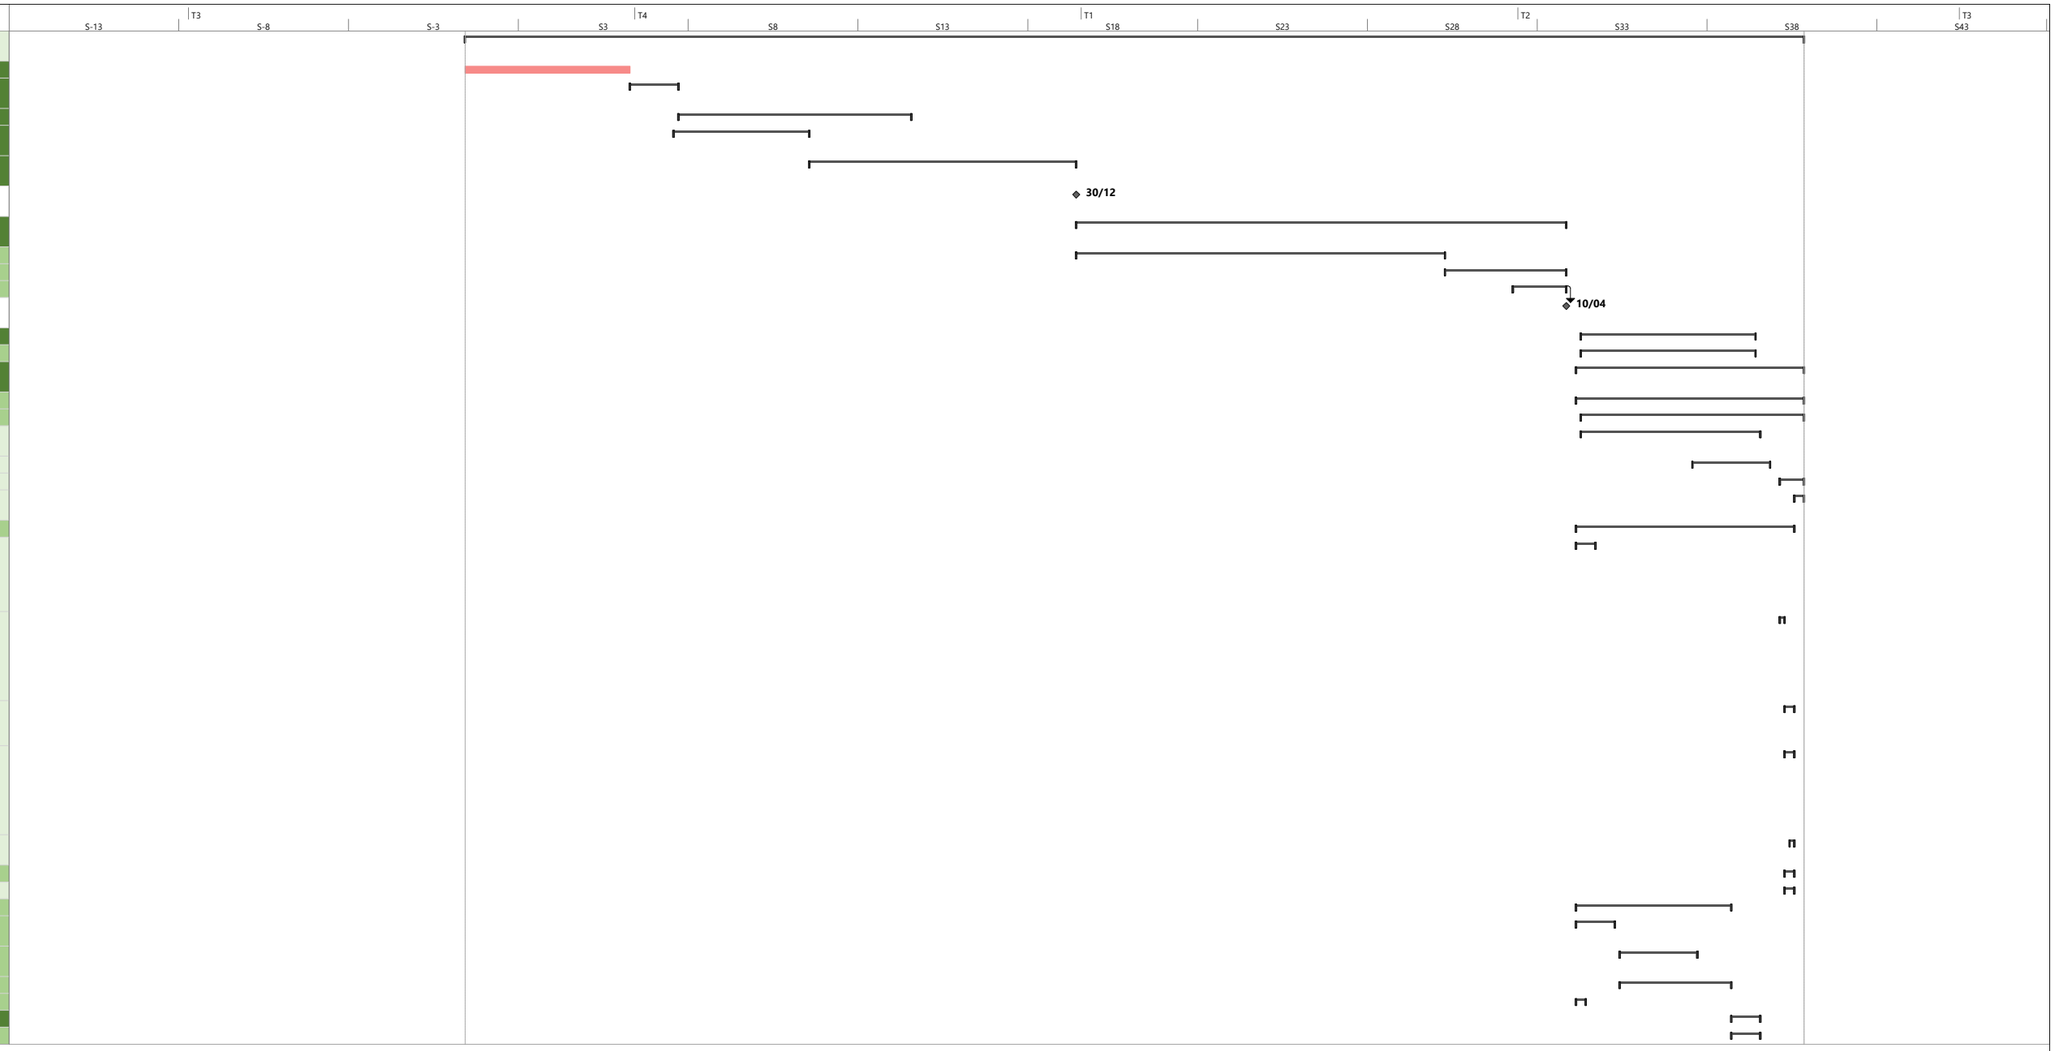

Projeto: CRONOGRAMA LUZIA
Data: Ter 08/04/25

Tarefa · Divisão · Marco · Resumo · Resumo do projeto · Tarefa Inativa · Marco Inativo · Resumo Inativo · Tarefa Manual · Somente duração · Acúmulo de Resumo Manual · Resumo Manual · Somente início · Somente término · Tarefas externas · Marco externo · Data limite · Crítica · Divisão crítica · Andamento · Progresso manual
